


Aula 6- Sprint 3

Planning, Dailies e Desenvolvimento



Equipe: Maycon, Mauricio, Raphaella, Rodrigo e Viviane

Professor: Gabriel Caixeta

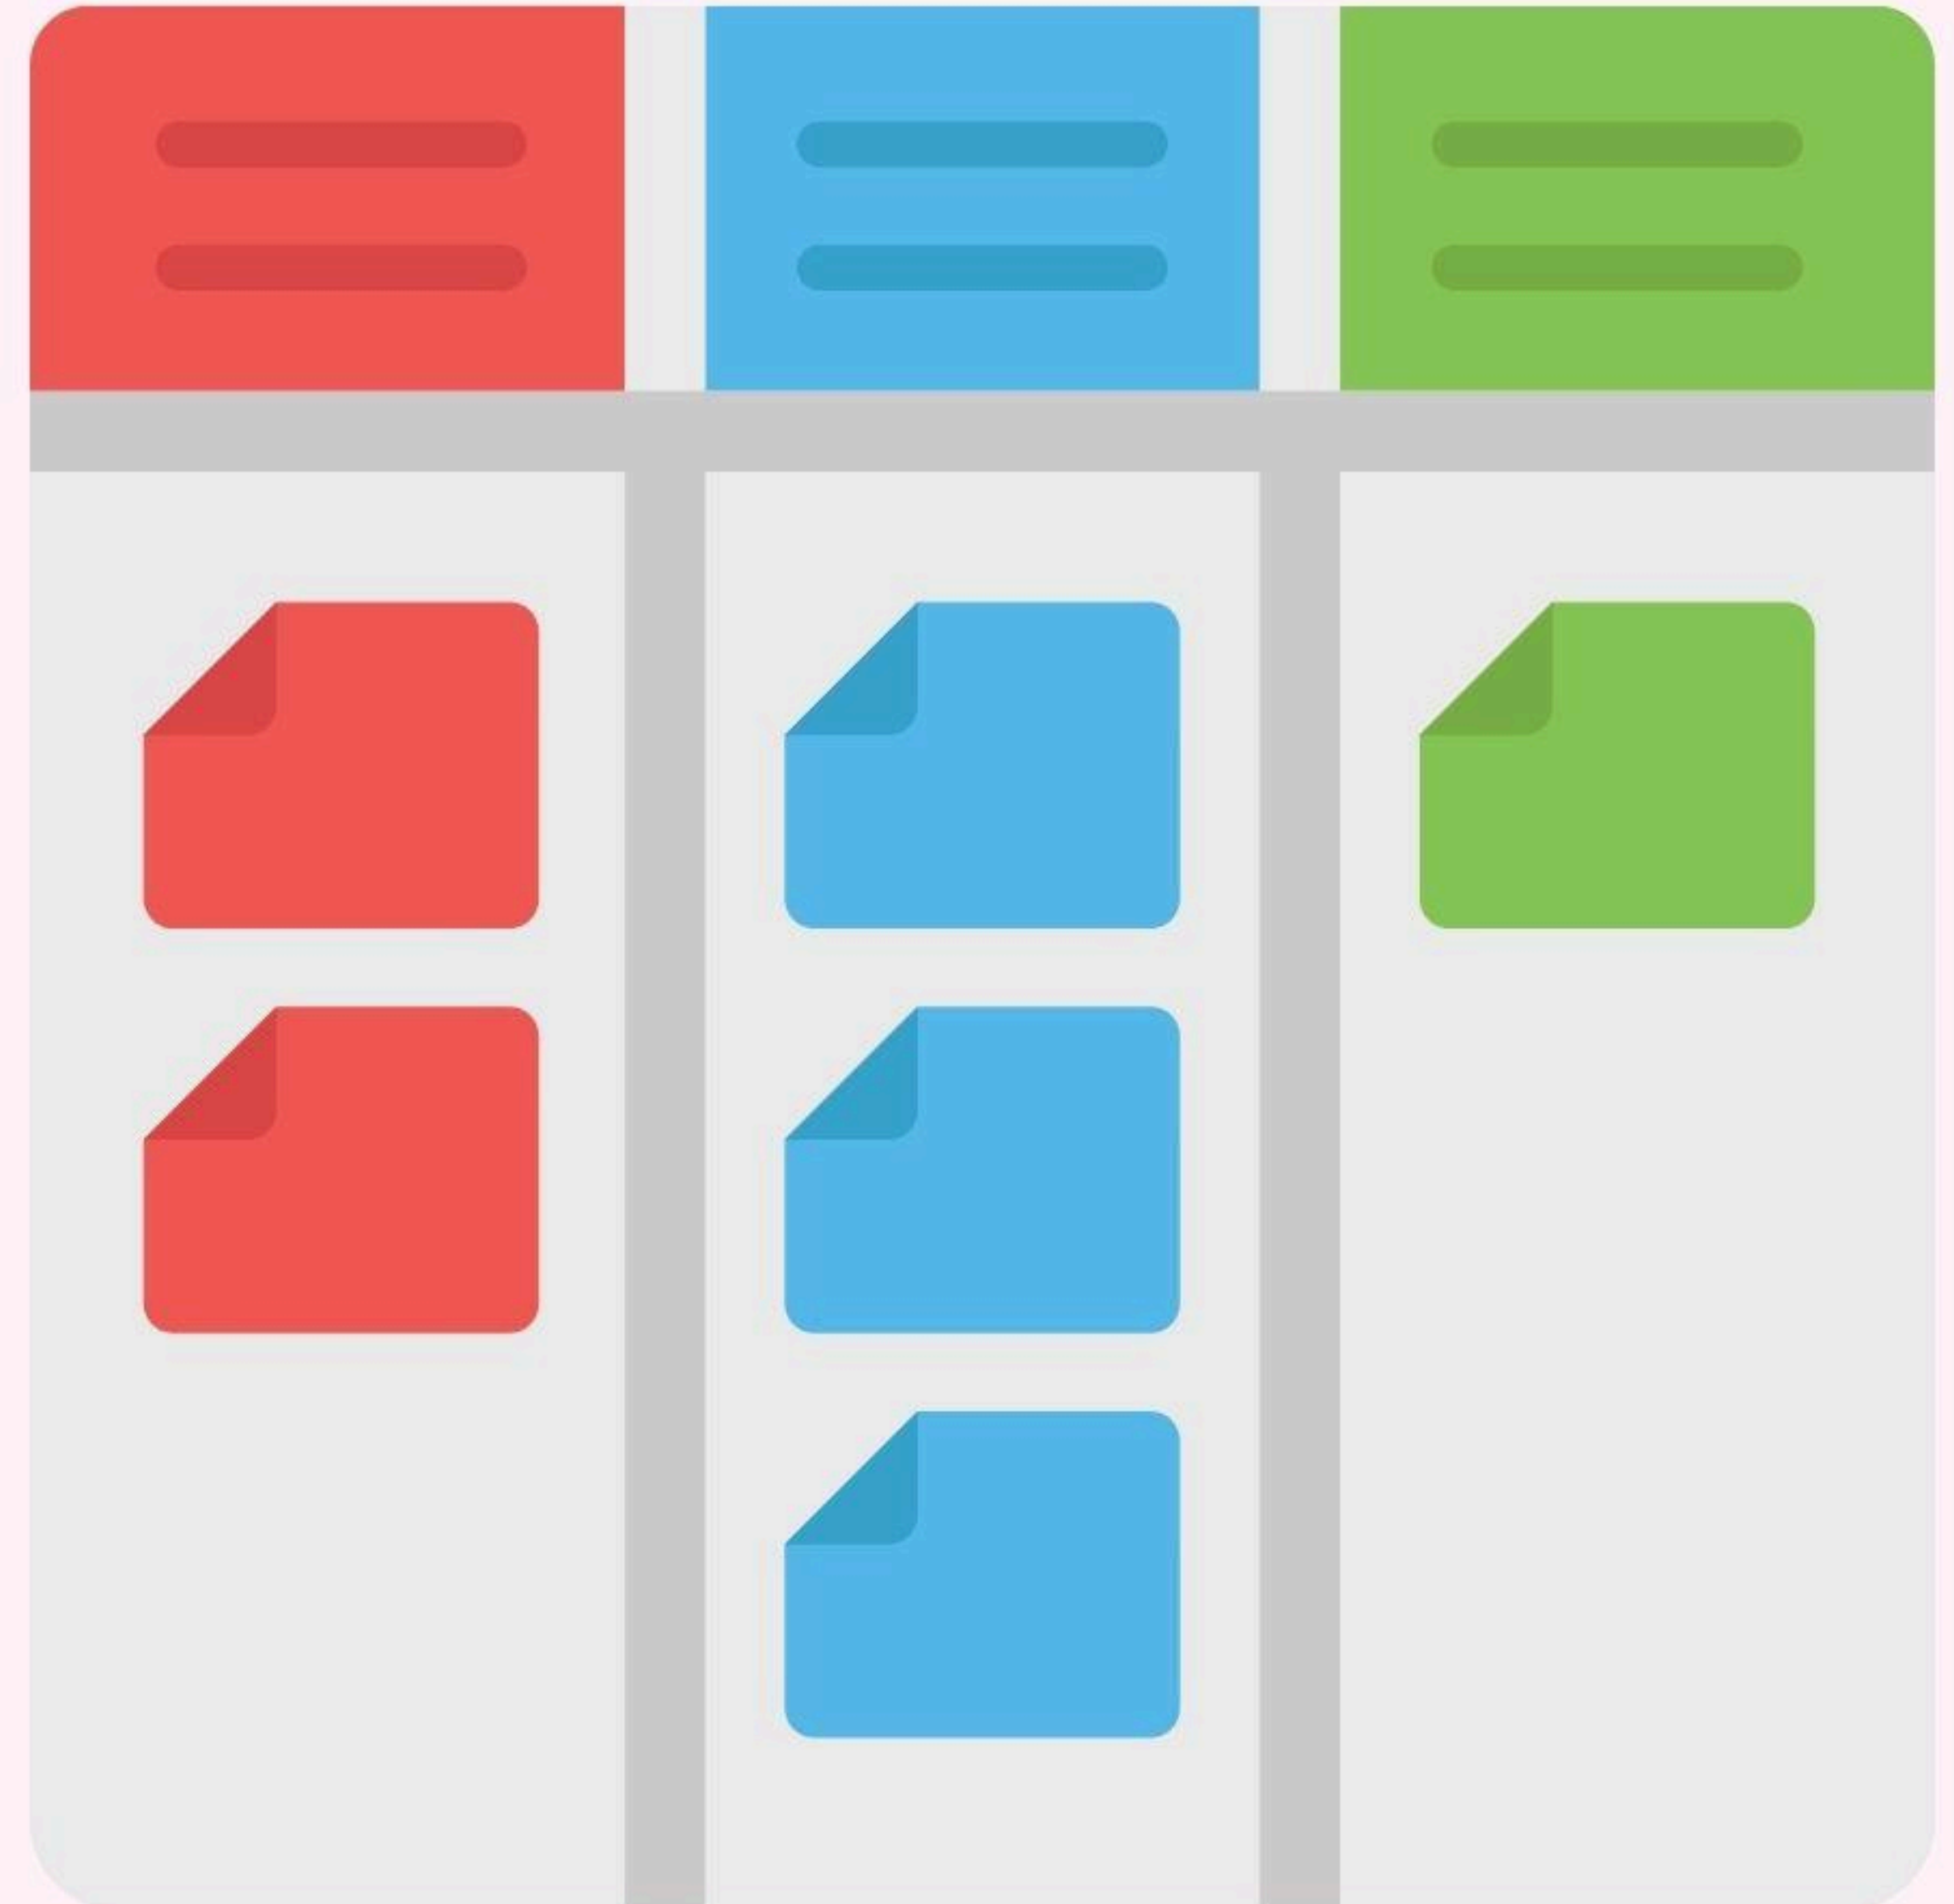

A Sprint 3 fecha o incremento do produto

Concluir o desenvolvimento e consolidar as práticas ágeis de avaliação e validação para a entrega final.

Resultado esperado

Escopo: itens essenciais finalizados

Fluxo: Kanban atualizado até Feito

Qualidade: ajustes das validações anteriores

Preparação: roteiro pronto para a Aula 7

Indicadores trabalhados: 1 e 2

O foco é concluir o que foi priorizado — sem abrir novas frentes.

Cada integrante assume um papel claro na Sprint 3

Divisão definida para organizar decisão, facilitação, execução, documentação e validação.



Integrante	Papel na sprint	Responsabilidade principal
Maycon	Product Owner (PO)	Priorizar o backlog, decidir o escopo e validar o incremento.
Mauricio	Scrum Master	Conduzir as Dailies, registrar impedimentos e apoiar o fluxo.
Raphaella	Desenvolvimento e documentação	Executar itens e registrar o Sprint Backlog e os avanços.
Rodrigo	Desenvolvimento e Kanban	Implementar ajustes e manter o quadro Kanban atualizado.
Viviane	Desenvolvimento e validação	Testar o incremento e organizar a apresentação da Review.

PO e Scrum Master são exclusivos; Raphaella, Rodrigo e Viviane formam o time de desenvolvimento.

Execução prioriza concluir, validar e decidir a tempo

110

minutos de desenvolvimento

Finalizar: o incremento do produto

Incorporar: ajustes das validações das Sprints 1 e 2

Movimentar: cada item pelo Kanban até Feito

Evitar: novas frentes e mudanças amplas de escopo

SEGUNDA DAILY • 10 MIN

O que foi feito, falta ou travou?

Se algo não puder ser concluído antes da Sprint Review, o time decide com o PO o que retirar do escopo.

Cortar cedo protege a qualidade da entrega final.

Planning define o que cabe; a Daily inicia a execução

30 min

Sprint Planning

PO: apresenta o Product Backlog e os itens pendentes

Equipe: seleciona o necessário para finalizar o incremento

Registro: preenche o Sprint Backlog e atualiza o Kanban

10 min

Primeira Daily

Integrantes: informam qual item vão puxar para começar

Scrum Master: conduz a conversa e anota impedimentos

Saída: todos iniciam com prioridade e responsabilidade claras

Decisão-chave: comprometer-se apenas com o que pode ser entregue.

Sprint Backlog proposto para a equipe

Itens finais, responsáveis, status da sprint e confirmação para a Sprint Review.

Item do backlog	Responsável	Status ao final	Segue para a Review?
Finalizar o incremento e incorporar os ajustes	Raphaella + Rodrigo	Feito	Sim
Atualizar o Kanban e registrar o Sprint Backlog	Rodrigo + Raphaella	Feito	Sim
Validar a entrega e preparar a Sprint Review	Viviane + Maycon + Mauricio	Em andamento	Sim

O Product Owner valida o escopo; o Scrum Master acompanha impedimentos e conclusão dos itens.

A entrega no Teams precisa reunir quatro itens

1 Kanban final **ITEM 1**

Foto ou print do quadro com os itens em cada coluna.

2 Sprint Backlog **ITEM 2**

Template preenchido com responsáveis, status e observações.

3 Sprint Review **ITEM 3**

Roteiro preenchido com ordem, conteúdo e apresentadores.

4 Equipe e papéis **ITEM 4**

Lista dos integrantes e o papel de cada pessoa nesta sprint.

5 Conferência **ANTES**

Revisar os arquivos e confirmar todos os responsáveis.

6 Envio no Teams **ENVIAR**

Enviar os quatro itens pela atividade disponibilizada no Teams.

Próximo passo: conferir os arquivos e enviar tudo pelo Teams.

A Sprint Review terá uma ordem simples e objetiva

Roteiro proposto para mostrar contexto, incremento e validação sem repetir informações.

Ordem	O que será mostrado	Quem apresenta	Liga com
1	Backlog, escopo e organização da sprint	Maycon + Mauricio	Briefing e priorização
2	Demonstração do incremento concluído	Raphaella + Rodrigo	Persona e validação
3	Testes, aprendizados e fechamento	Viviane	Validação e decisão final

Mauricio também facilita a transição entre as partes; Maycon confirma a aceitação do incremento como PO.

A aula avança em seis movimentos até a Review

1 Rotação 10 min

Redefinir PO, Scrum Master e time.

2 Planning 30 min

Selecionar itens finais e registrar o backlog.

3 1ª Daily 10 min

Escolher o primeiro item e relatar impedimentos.

4 Desenvolvimento 110 min

Finalizar o incremento e mover itens até Feito.

5 2ª Daily 10 min

Revisar avanço, bloqueios e cortes de escopo.

6 Preparar 30 min

Definir roteiro, demonstração e apresentadores para a Review.

Tempo previsto: 200 minutos
